

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

En la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, ubicada en el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las 12 horas con 19 minutos del día 24 de noviembre del año dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón Monte Albán de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, los CC. **Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar**, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en su carácter de Presidente Suplente en el Comité Técnico de CAPUFE; **Ing. Eduardo Velasco Santana**, Delegado Regional VI Zona Sureste y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; en representación del **Lic. Alfredo López Ríos**, Administrador Desconcentrado Jurídico de Oaxaca "1" y Titular del Comité Técnico de CAPUFE el **Lic. Jorge Robles Guzmán**, Subadministrador Desconcentrado Jurídico de Oaxaca "1"; en representación del **Lic. Antonio Sacre Rangel**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE, **Técnico Crisóforo Landa Ortiz**, Analista especializado en la Subdelegación Técnica de la Delegación Regional VI Zona Sureste de CAPUFE; el **Ing. David Fridstein Flores**, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; **Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores**, Director de Planeación de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y el **Lic. Carlos Márquez del Campo**, Jefe de Departamento de Atención a la Demanda y el **Ing. Guillermo Robles Robles**, Jefe de Coordinación Operativa Zona Norte de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, con la finalidad de celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE, Oaxaca.

En uso de la palabra, el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar en su calidad de Suplente del Presidente del Comité, da la formal bienvenida a los titulares y suplentes del Comité Técnico de CAPUFE, en consecuencia se procede al desahogo de la reunión de conformidad al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación de asistentes.
- II. Verificación de quórum y en su caso apertura de la sesión.
- III. Evaluación de los acuerdos tomados en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE ejercicio 2016.
- IV. Presentación por parte del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec los avances de la obra denominada: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD BENITO JUÁREZ DEL KM. 0 AL KM. 0+692.32".
- V. Presentación por parte de Caminos y Aeropistas de Oaxaca los avances de la obra denominada: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA ÚRSULA-LOS REYES-CERRO DE ORO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 7+000 AL KM. 7+700", en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.
- VI. Asuntos generales.
- VII. Acuerdos.
- VIII. Clausura de la Sesión.

I. BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA

En cumplimiento al primer punto del orden del día, el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar Presidente Suplente del Comité, dirige la presentación de los asistentes y da la bienvenida a todos y cada uno de ellos

II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y EN SU CASO APERTURA DE LA SESIÓN

Hecha la presentación de los asistentes, encontrándose presentes todos los integrantes y contando con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las 12 horas 21 minutos, se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abierta la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS-----

III. EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE EJERCICIO 2016.-----

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en su carácter de Presidente Suplente en el Comité Técnico de CAPUFE da lectura a los acuerdos:

1. La Secretaría de Finanzas continuará con el trámite del pago del complemento del anticipo (\$461,497.99) de la obra autorizada para el presente ejercicio fiscal 2016 al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.
2. Se aprueba otorgarle a Caminos y Aeropistas el recurso remante por la cantidad de \$2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos) para la obra propuesta: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA ÚRSULA-LOS REYES-CERRO DE ORO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 7+000 AL KM. 7+700", la cual se ejecutará en el presente ejercicio fiscal 2016.

El resultado de los acuerdos a la fecha son los siguientes:

Acuerdo Número 1.

La transferencia del recurso se realizó el día cuatro de julio del presente por la cantidad acordada: \$461,497.99 (Cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y siete pesos 99/100 M.N.).

Acuerdo Número 2.

A Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) aún no se le ha otorgado ningún pago, únicamente hemos recibido copia simple del contrato de obra; el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, hace entrega de una copia simple a los miembros del Comité Técnico.

IV. PRESENTACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOS AVANCES DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD BENITO JUÁREZ DEL KM. 0 AL KM. 0+692.32"-----

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar cede la palabra al Ing. David Fridstein Flores, Director de Obras del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec quien informará la situación actual de la obra autorizada para el presente ejercicio fiscal.

En uso de la palabra el Ing. David Fridstein Flores, la obra está terminada al 100% y en operación, financieramente tiene un avance del 42%.

En uso de la palabra el Ing. Eduardo Velasco Santana, Delegado Regional VI Zona Sureste y Titular del Comité Técnico de CAPUFE constató que ya realizó una visita física a la obra, la cual cumplió con los objetivos planteados.

V. PRESENTACIÓN POR PARTE DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA LOS AVANCES DE LA OBRA DENOMINADA: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA ÚRSULA-LOS REYES-CERRO DE ORO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 7+000 AL KM. 7+700", EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC-----

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar cede la palabra al Ing. Guillermo Robles Robles, Jefe de Coordinación Operativa Zona Norte de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), quien informará la situación actual de la obra autorizada para el presente ejercicio fiscal, quien en uso de la palabra menciona que la obra tiene un avance de 1.3% y al ver esta situación han decidido rescindir la obra a la empresa contratada por que no ven avance.

En uso de la palabra el Lic. Jorge Robles Guzmán, Subadministrador Desconcentrado Jurídico de Oaxaca "1", manifiesta que se haga cumplimiento en los términos del contrato y de ley.

VI. ASUNTOS GENERALES

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, informa al Comité Técnico sobre la situación del recurso del fondo y menciona que el cuatro de Octubre del presente se realizó un pago parcial al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec por concepto de la primera estimación de la obra autorizada para el presente ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de: \$ 2,209,869.30 (Dos millones doscientos nueve mil ochocientos sesenta y nueve pesos 30/100 M.N.).

Pago 30% Anticipo (Pagado 100%)	Recurso Municipal	Recurso Estatal (Primer acuerdo de la segunda Sesión Ordinaria)
\$ 4,361,497.99	\$ 3,900,000.00	\$ 461,497.99

Primera Estimación	Pago de la Cuenta del Mpio.	Pago parcial Est. 1 de la cuenta Estatal	Total pagado a empresa de Est. 1	Faltante a Mpio. por pagar
\$5,277,549.09	\$1,923,000.00	\$2,209,869.30	\$4,132,869.30	\$1,144,679.79

Pagará el Estado de la cuenta CAPUFE	Pago parcial anticipo	Pago parcial Est. 1	Pendiente por pagar por Estado
\$ 4,584,430.05	\$ 461,497.99	\$ 2,209,869.30	\$ 1,913,062.76

Recurso cta. Bancaria fondo CAPUFE	Recurso autorizado a CAO, según acuerdo.	Recurso disponible a la fecha.
\$ 3,630,189.98	\$ 2,500,000.00	\$ 1,130,189.98

El Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, informa que pone a consideración del Comité Técnico el recurso disponible en la cuenta Estatal.

Por unanimidad el Comité Técnico aprueba se le pague el total del adeudo al Municipio debido a que a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) no se le otorgará el recurso autorizado al inicio del ejercicio fiscal, por incumplimiento de la empresa.

El recurso será para continuar con el pago de la obra terminada por el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.

VII. ACUERDOS

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

1. La obra asignada a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) se encuentra en proceso de rescisión, el recurso que estaba asignado para este fin ya no será ejercido por CAO.
2. A la garantía del contrato realizado por Caminos y Aeropistas de Oaxaca con la empresa constructora, se le dará el cumplimiento de acuerdo a ley.
3. Por unanimidad el Comité Técnico aprueba retirar el recurso a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) por incumplimiento de contrato y transferirlo al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec para el pago de la estimación pendiente.
4. El recurso que se reciba en los meses de Noviembre y Diciembre a la cuenta del Estado será transferido al Municipio para finiquitar el pago de la obra autorizada y ejecutada para el presente ejercicio fiscal 2016.

VIII.CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas con 10 minutos del día en que se actúa, el Lic. Rodrigo Yzquierdo Aguilar, Presidente Suplente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomaron, por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y aprobación se firma y autoriza por los presentes para su debida constancia.


POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE




ING. EDUARDO VELASCO SANTANA
DELEGADO REGIONAL VI ZONA SURESTE Y
TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE



LIC. RODRIGO YZQUIERDO AGUILAR
DIRECTOR DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
OAXACA Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL
COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

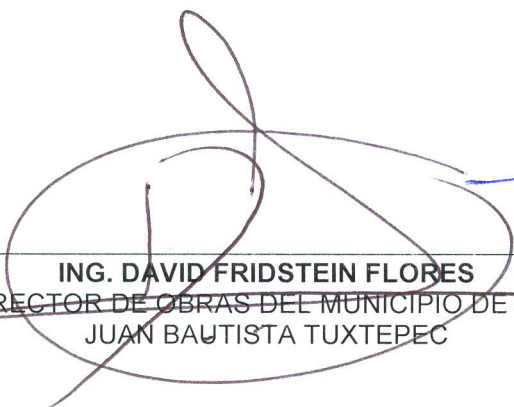


ING. DAVID FRIDSTEIN FLORES
DIRECTOR DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC




LIC. JORGE ROBLES GUZMÁN
SUBADMINISTRADOR DESCONCENTRADO
JURÍDICO DE OAXACA "1"


**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS-----**



ING. GILDARDO ARTURO ELORZA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE CAMINOS Y
AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)



LIC. CARLOS MARQUEZ DEL CAMPO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA
DEMANDA DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE
OAXACA (CAO)



ING. GUILLERMO ROBLES ROBLES
JEFE DE COORDINACIÓN OPERATIVA ZONA
NORTE DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE
OAXACA

1

Las firmas contenidas en la presente foja corresponden a la foja 5 de 5 del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) celebrada el día 24 de noviembre de 2016.
