

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS

Reunidos en plataforma zoom los CC. **Mtro. Heyner Ramírez Ramírez**, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en su carácter de Presidente Suplente en el Comité Técnico de CAPUFE; el **Lic. Omar Contreras Espinosa**, Gerente de la Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; el **Técnico Crisóforo Landa Ortiz**, Analista especializado en la Subgerencia Técnica de la Unidad Regional Coatzacoalcos de CAPUFE; la **Lic. Margarita Condado Arroyo**, Administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" del SAT y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; el **Lic. Jorge Robles Guzmán**, Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1" y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE; el **Lic. Irineo Molina Espinoza**, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE; el **Dr. Emilio Grajales**, Director de Obras Públicas del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; el **Ing. Gerardo Gómez Cruz**, Subdirector de Infraestructura Básica del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y el **Ing. Francisco Javier Ayala Maldonado**, Coordinador de Proyectos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, con la finalidad de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE, Oaxaca, con el siguiente orden del día:-----

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación de asistentes.
- II. Verificación de quórum y en su caso apertura de la sesión.
- III. El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec informará el finiquito de la obra autorizada por el Comité Técnico para el ejercicio fiscal 2022 denominada: "MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD BICENTENARIO EN EL TRAMO PUENTE CARACOL – EL ACUYO DEL KM. 115+200 AL 117+820, SUBTRAMO DEL KM. 116+204 AL KM. 116+760".
- IV. Asuntos Generales.
- V. Acuerdos.
- VI. Clausura de la Sesión.

I. BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA

En cumplimiento al primer punto del orden del día, el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, Presidente Suplente del Comité, da la bienvenida a todos y cada uno de los integrantes a la sesión haciendo uso de la plataforma zoom. -

II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y EN SU CASO APERTURA DE LA SESIÓN

Realizada la presentación de los asistentes, se realiza el pase de lista, estando presentes todos los integrantes y contando con el quórum que legalmente se requiere para la celebración de la presente sesión. Siendo las diez horas con diez minutos, se declara formalmente instalado el Comité Técnico y abierta la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de CAPUFE.-----

III. EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC INFORMARÁ EL FINIQUITO DE LA OBRA AUTORIZADA POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DENOMINADA: "MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD BICENTENARIO EN EL TRAMO PUENTE CARACOL – EL ACUYO DEL KM. 115+200 AL 117+820, SUBTRAMO DEL KM. 116+204 AL KM. 116+760"

El Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, en su calidad de Suplente del Presidente del Comité Técnico informa a los miembros del Comité Técnico los antecedentes financieros de la obra autorizada por el Comité Técnico para el ejercicio fiscal 2022.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS

Costo Total de la obra: \$13,218,350.50 (trece millones doscientos dieciocho mil trescientos cincuenta pesos 50/100 m.n.). De la cuenta del Estado se pagaron las Estimaciones 1 y 2.

Estimación 1: \$ 4,358,428.22 (cuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho pesos 22/100 m.n.). Estimación 2: \$ 1,198,250.00 (un millón ciento noventa y ocho mil doscientos cincuenta pesos 00/00 m.n.). Haciendo un total de \$ 5,556,678.22 (cinco millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y ocho pesos 22/100 m.n.).

Saldo pendiente por ministrar: capital: \$135,031.99 (ciento treinta y cinco mil treinta y un pesos 99/100 m.n.) y productos: \$29,912.84 (veintinueve mil novecientos doce pesos 84/100 m.n.), en total \$ 164,944.83 (ciento sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 83/100 m.n.).

Durante el ejercicio fiscal 2022 se recibieron en total \$ 13,623,395.91 (trece millones seiscientos veintitrés mil trescientos noventa y cinco pesos 91/100 m.n.) de los cuales \$ 5,691,566.18 (cinco millones seiscientos noventa y un mil quinientos sesenta y seis pesos 18/100 m.n.) corresponden al Estado y \$ 7,931,829.73 (siete millones novecientos treinta y un mil ochocientos veintinueve pesos 73/100 m.n.) corresponden al Municipio.

El Convenio de ampliación fue por la cantidad de \$ 464,185.17 (cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco pesos 17/100 m.n.) incluyendo los productos de las dos cuentas bancarias Estatal y Municipal.

El Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, cede la palabra a los representantes del Municipio; en uso de la palabra el Ing. Gerardo Gómez Cruz, Subdirector de Infraestructura Básica del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, manifiesta que efectivamente coinciden con las cifras mencionadas, asimismo hace mención que la obra aún no ha sido finiquitada, derivado de que se tiene pendiente de pago las Estimación 3 del contrato original y 4 convenio – finiquito, mismas que están en proceso de revisión y envío a la administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca “1” para su validación correspondiente.

En su intervención el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, solicita que se envíen las estimaciones a la brevedad posible para su validación, así mismo se hace referencia a la cuenta Estatal del programa 2022, que deberá ser cancelada, tan pronto como se hagan los reintegros correspondientes y se encuentre en ceros, a fin de aperturar la nueva cuenta para el ejercicio 2023, tal y como se establece en el Convenio.

El Lic. Jorge Robles Guzmán, Subadministrador Desconcentrado de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca “1” y Suplente del Titular del Comité Técnico de CAPUFE, en uso de la palabra manifiesta que se deben pagar las Estimaciones pendientes para saber si hay saldo en las cuentas bancarias y según el caso hacer la devolución correspondiente.

Por su parte el Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y Titular del Comité Técnico de CAPUFE informa al Comité que tienen proyectado darle continuidad al tramo que se construyó en el ejercicio 2022.

Al respecto la representación de CAPUFE, manifiesta que pueden presentar su proyecto para su revisión y validación por parte del Comité Técnico, tomando como base para el presupuesto, el importe total recibido en el ejercicio fiscal 2022, el cual fue de \$13,623,395.91 (trece millones seiscientos veintitrés mil trescientos noventa y cinco pesos 91/100 m.n.) tal y como se ha hecho en años anteriores y a fin de no retrasar el inicio de los trabajos, para poder concluirlos a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Para finalizar el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, da por terminada la sesión.

IV. ASUNTOS GENERALES

No hay asuntos generales.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS

V. ACUERDOS

PRIMERO.- El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec hará entrega del Convenio de ampliación de la obra autorizada por el Comité Técnico para el ejercicio fiscal 2022.

SEGUNDO.- El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec entregará a la brevedad posible las Estimaciones 3 y 4 finiquito para el trámite correspondiente para proceder con su pago.

TERCERO.- Después de realizar los pagos se revisarán las cuentas bancarias Estatal y Municipal y se informará a los miembros del Comité Técnico los saldos.

CUARTO.- La Secretaría de Finanzas cancelará la cuenta bancaria del ejercicio fiscal 2022 y se aperturará una nueva cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del ejercicio fiscal 2023.

El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, hará lo propio para la parte que le corresponde.

QUINTO.- El Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, presentará el proyecto de obras para el ejercicio fiscal 2023 al Comité Técnico y a la Unidad Regional Coatzacoalcos, de CAPUFE, solicitando su revisión y validación correspondiente.

SEXTO.- La Presidencia del Comité Técnico, convocará a Sesión Ordinaria tan pronto como el Municipio presente sus proyectos de obras para el ejercicio fiscal 2023, en la cual serán aprobadas o rechazadas de acuerdo con la votación que emitan los integrantes del Comité Técnico.

VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas con veintiséis minutos del día en que se actúa, el Mtro. Heyner Ramírez Ramírez, Presidente Suplente del Comité Técnico de CAPUFE, declara clausurada esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomaron, por lo que se redacta la presente acta, que previa lectura y aprobación se firma en cuatro tantos por los presentes para su debida constancia.

POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

MTRO. HEYNER RAMÍREZ RAMÍREZ
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE), CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS**

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



LIC. MARGARITA CONDADO ARROYO,
ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA JURÍDICA
DE OAXACA "1" DEL SAT Y TITULAR DEL COMITÉ
TÉCNICO DE CAPUFE




LIC. JORGE ROBLES GUZMÁN
SUBADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE LA
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA DE OAXACA "1" Y
SUPLENTE DEL TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO
DE CAPUFE

POR CAMINOS Y PUENTES FEDERALES




LIC. OMAR CONTRERAS ESPINOSA
GERENTE DE LA UNIDAD REGIONAL
COATZACOALCOS DE CAPUFE Y
TITULAR DEL COMITÉ TÉCNICO DE CAPUFE




TÉCNICO CRISÓFORO LANDA ORTIZ
ANALISTA ESPECIALIZADO EN LA SUBGERENCIA
TÉCNICA DE LA UNIDAD REGIONAL
COATZACOALCOS DE CAPUFE

POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

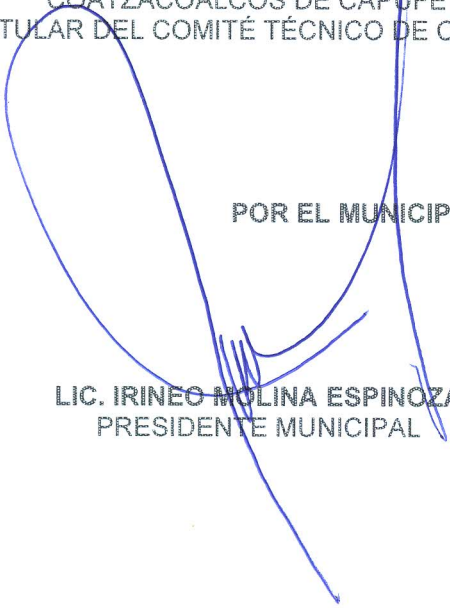

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Las presentes firmas corresponden a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), celebrada el siete de marzo de 2023.
